Ny hal Skovgårdsskolen

Lavet af: JKM
Dato:2009.12.16

Id	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Bemanding	Foregående opgaver
1	**Beton arbejder**	**43 dage**	**fr 05-06-09**		
2					
3					
4	**Fundaments arbejde**	**10 dage**	**fr 05-06-09**		
5	**Punktfundamenter**	**2 dage**	**fr 05-06-09**		
6	Tilregning af byggeplads	1 dag	fr 05-06-09	2	
7	udgravning til punktfundamenter	1 dag	fr 05-06-09	2	
8	Montering af armering og udstøbning	1 dag	ma 08-06-09	2	7
9					
10	**Stribefundament ved omklædning inkl. Reces**	**2 dage**	**ma 08-06-09**		
11	Udgavning	1 dag	ma 08-06-09	2	
12	Binding af armering	1 dag	ti 09-06-09	1	5
13	Opsætning af forskalling til reces	0,5 dage	ti 09-06-09	1	11
14	Udstøbning af renselag, montering af armering og udstøbning af fundament	0,5 dage	ti 09-06-09	2	13
15					
16	**Stribefundament hal**	**7 dage**	**on 10-06-09**		
17	Binding af armering	2 dage	on 10-06-09	4	10
18	Løbende udgravning og udstøbning af fundament	5 dage	fr 12-06-09	4	17
19					
20	**Terrændæks arbejde**	**17 dage**	**fr 19-06-09**		
21	**Terrændæk omklædning**	**3 dage**	**fr 19-06-09**		
22	Reparation af underlag til polystyren	0,5 dage	fr 19-06-09	4	16
23	Udlægning af polystyren	0,5 dage	fr 19-06-09	4	22
24	Udlægning af armering og forskalling	1 dag	ma 22-06-09	2	23
25	Registrering af varmeslanger til elementafstivning	0,5 dage	ti 23-06-09	1	24
26	Opbygning af sokkel under terrændæk	0,5 dage	ti 23-06-09	1	24
27	VVS monterer varmeslanger	0,5 dage	ti 23-06-09		24
28	Udstøbning af terrændæk i omklædning minus bad og toilet	0,5 dage	ti 23-06-09	2	27
29					
30	**Terrændæk i hal & tumlesal**	**12 dage**	**ma 22-06-09**		
31	Reparation af underlag	2 dage	ma 22-06-09	2	
32	Opbygning af sokkel under terrændæk	2 dage	on 24-06-09	2	
33	Sideløbende udlægning af polystyren, armering og forskalling	2 dage	on 24-06-09	2	31
34	Sideløbende udlægning af polystyren, armering og forskalling	7 dage	fr 26-06-09	4	33
35	VVS montering af gulvvarme	3 dage	ti 30-06-09		
36	Registrering af varmeslanger til elementafstivning	1 dag	fr 03-07-09	1	35
37	Udstøbning af terrændæk i hal, tumlesal, bad og toilet	1 dag	ti 07-07-09	4	34
38					
39	Tørretid for opnåelse af styrke til elementmontage på terrændæk i tumlesal	4 dage	on 08-07-09		37
40					
41	**Element montage**	**8 dage**	**to 16-07-09**		
42	Opstart af afsætning af elementer til omklædning	1 dag	to 16-07-09	1	39
43	Montering af elementer inkl. Afsætning	4 dage	fr 17-07-09	4	42
44	Sammenstøbning af elementer	3 dage	to 23-07-09	2	43
45					
46	**Sokkel arbejde**	**3 dage**	**to 23-07-09**		
47	Opmuring af sokkel	3 dage	to 23-07-09	2	
48					
49	Beton finish og afregning	2 dage	ti 28-07-09	2	46
50	Buffer	4 dage	to 30-07-09		49
51	Fjernelse af afstivning efter montering af tagkassetter	1 dag	to 20-08-09	2	
52	UE blødefuger	3 dage	fr 21-08-09		51

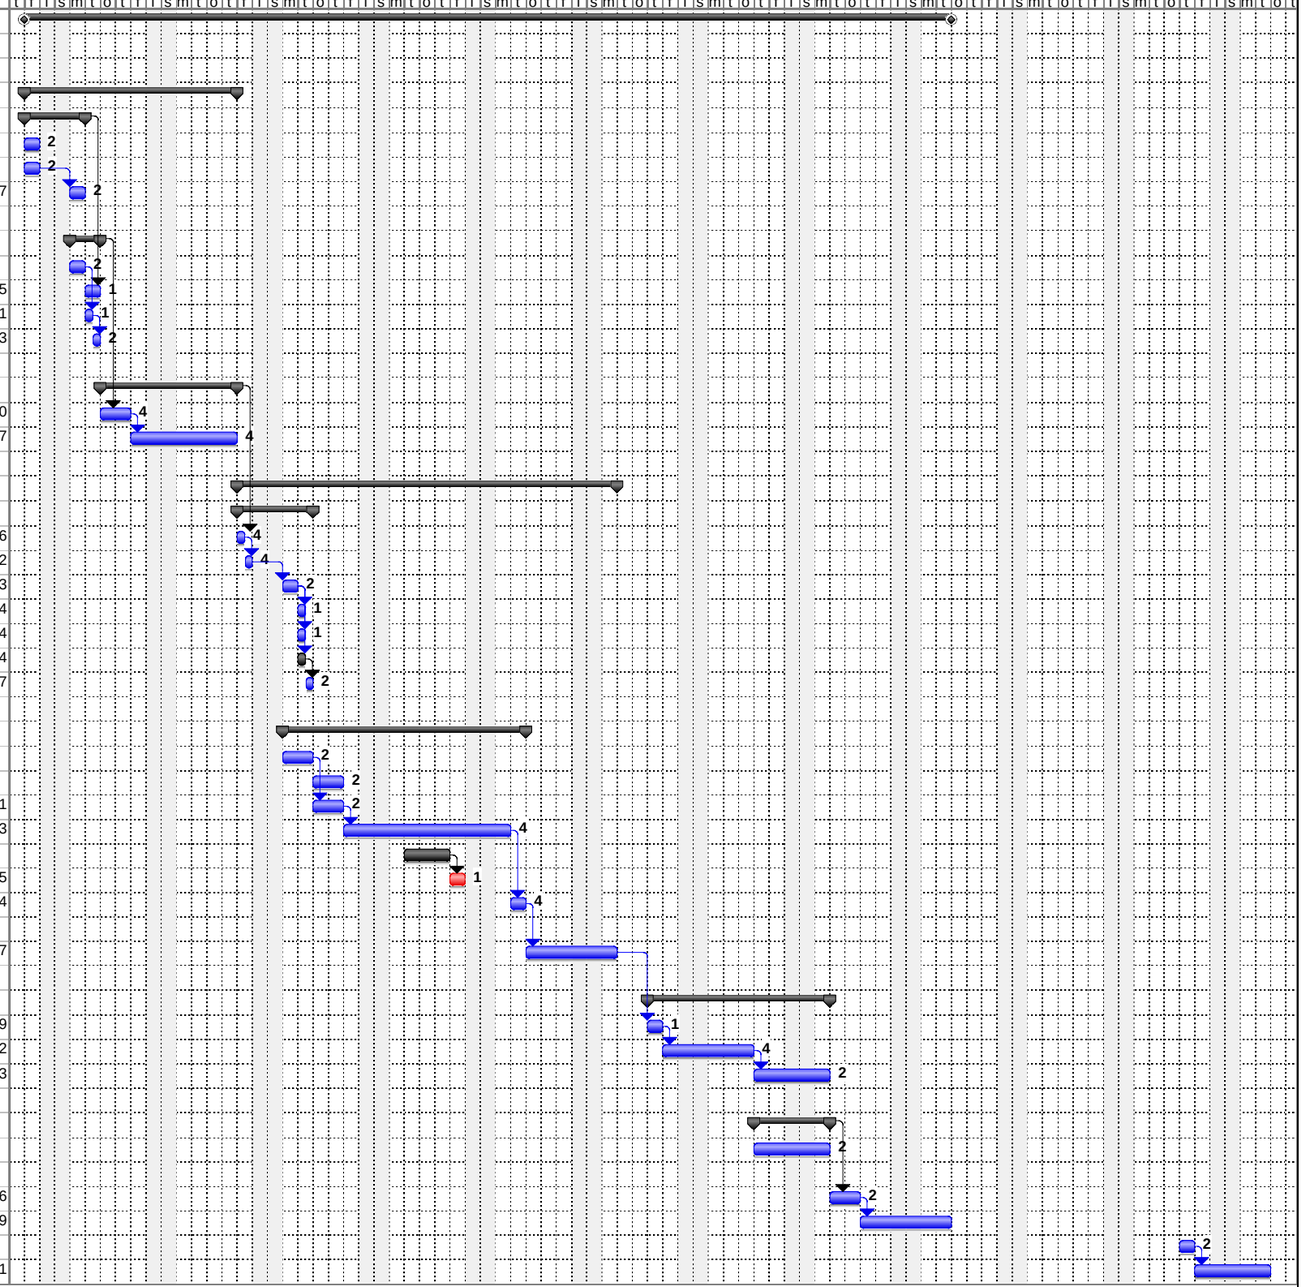

Opgave Oversigt

Sagsnavn: Ny hal Skovgårdsskolen
Sags nr.: E2009B
